NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015


1.- Resumen del proyecto

El presente proyecto consistió en realizar la habilitación de un contenedor acondicionado como camerines y baños, además de la habilitación con electricidad de un contenedor tipo oficina para el proyecto Sitio 6 de Puerto Ventanas. La ubicación de los contenedores se encuentra costado norte patio de granos, puerto Ventanas.

Fotos ubicación:



NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

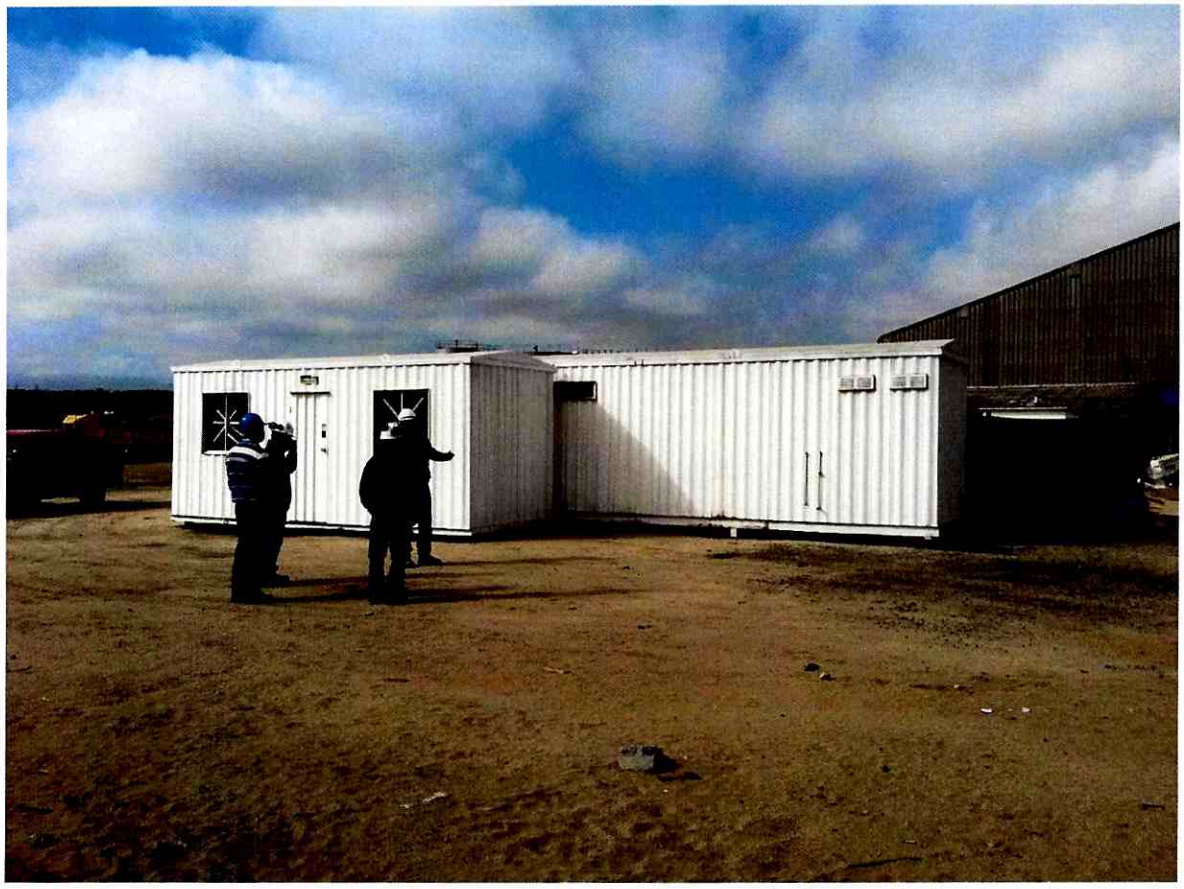

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

2.- Avances diario

Día 06/07/2015:

✓ **Trazado y replanteo**	
✓ **Excavación Dren**	


NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

✓ **Dimensiones del dren: 12 metros largos, 1 metro de ancho, según proyecto.**	
✓ **Excavación sistema eléctrico** ✓ **Dimensión de 0,8 metros de profundidad.**	
✓ **Protección sobre**	

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

conduit eléctrico de ladrillo y cinta de peligro	
✓ **Excavación sistema de agua potable con cañería hidráulica de 32mm puesta a una profundidad de 70 centimetros.** ✓	

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

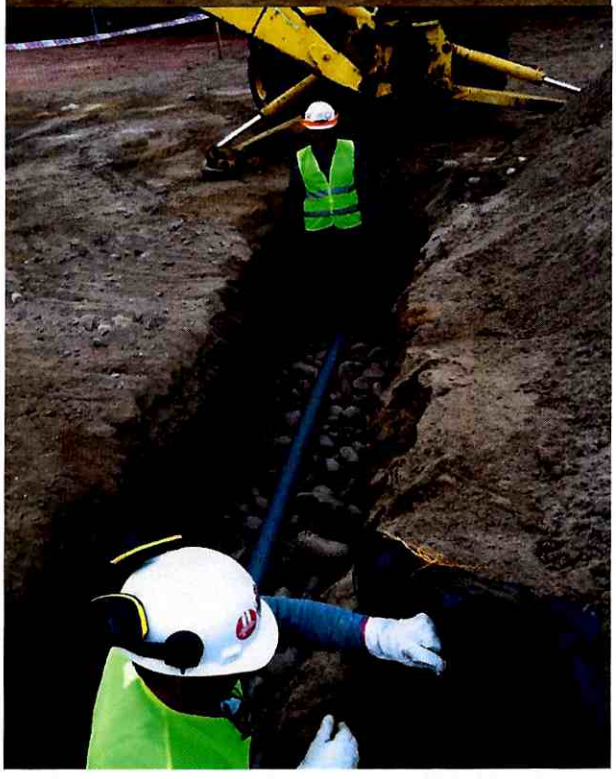✓ **Fabricación Dren**	 

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015







NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

✓ **Instalación fosa** ✓ **De 3250 litros mas cámara d inspeccion**	
✓	

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

- ✓ **Reubicación contenedores camarín y oficina**

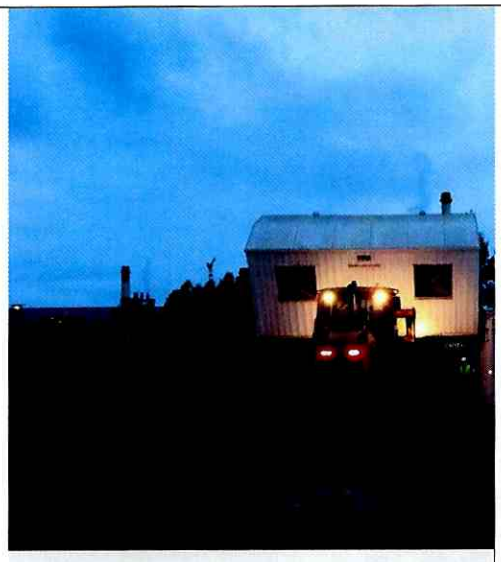


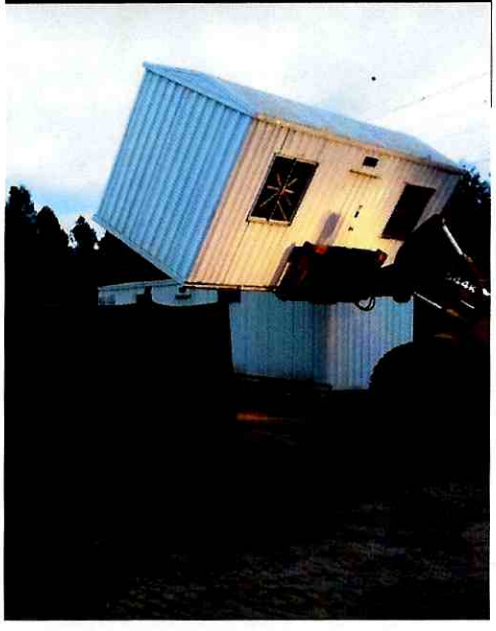

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

TERMINACIONES

ESTANQUE DE ACUMULACION 3400 LITROS CON FLOTADOR DE CORTE Y BOMBA DE IMPULSION 1 HP, CON AUTOMATICO ELECTRICO INDEPENDIENTE

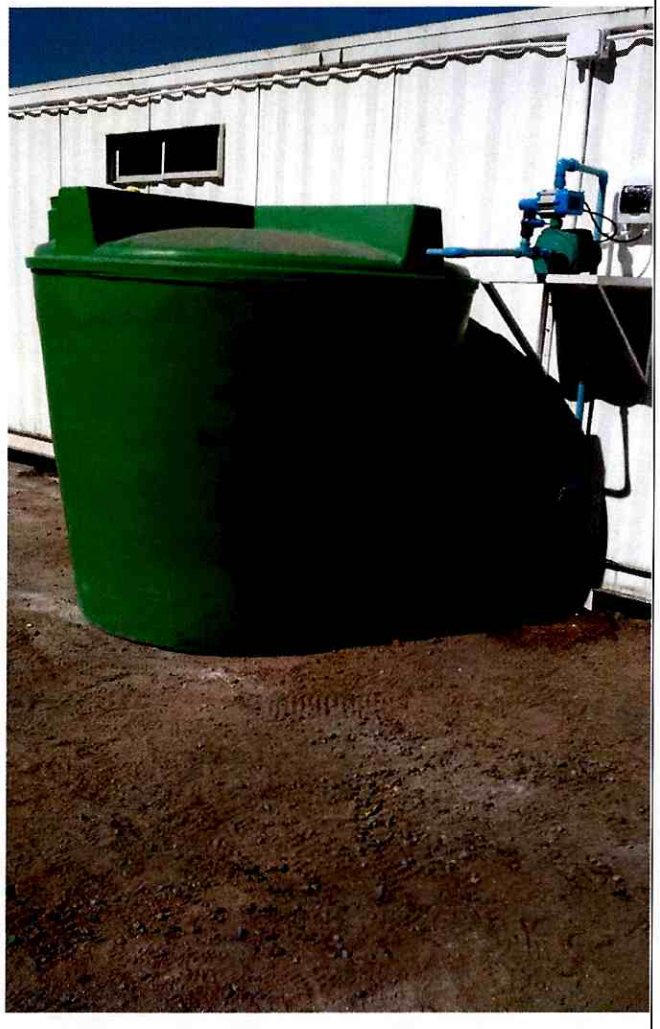

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

TERMINACIONES


CASETA DE BOMBA



NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

TERMINACIONES


CONEXIÓN
AGUA POTABLE

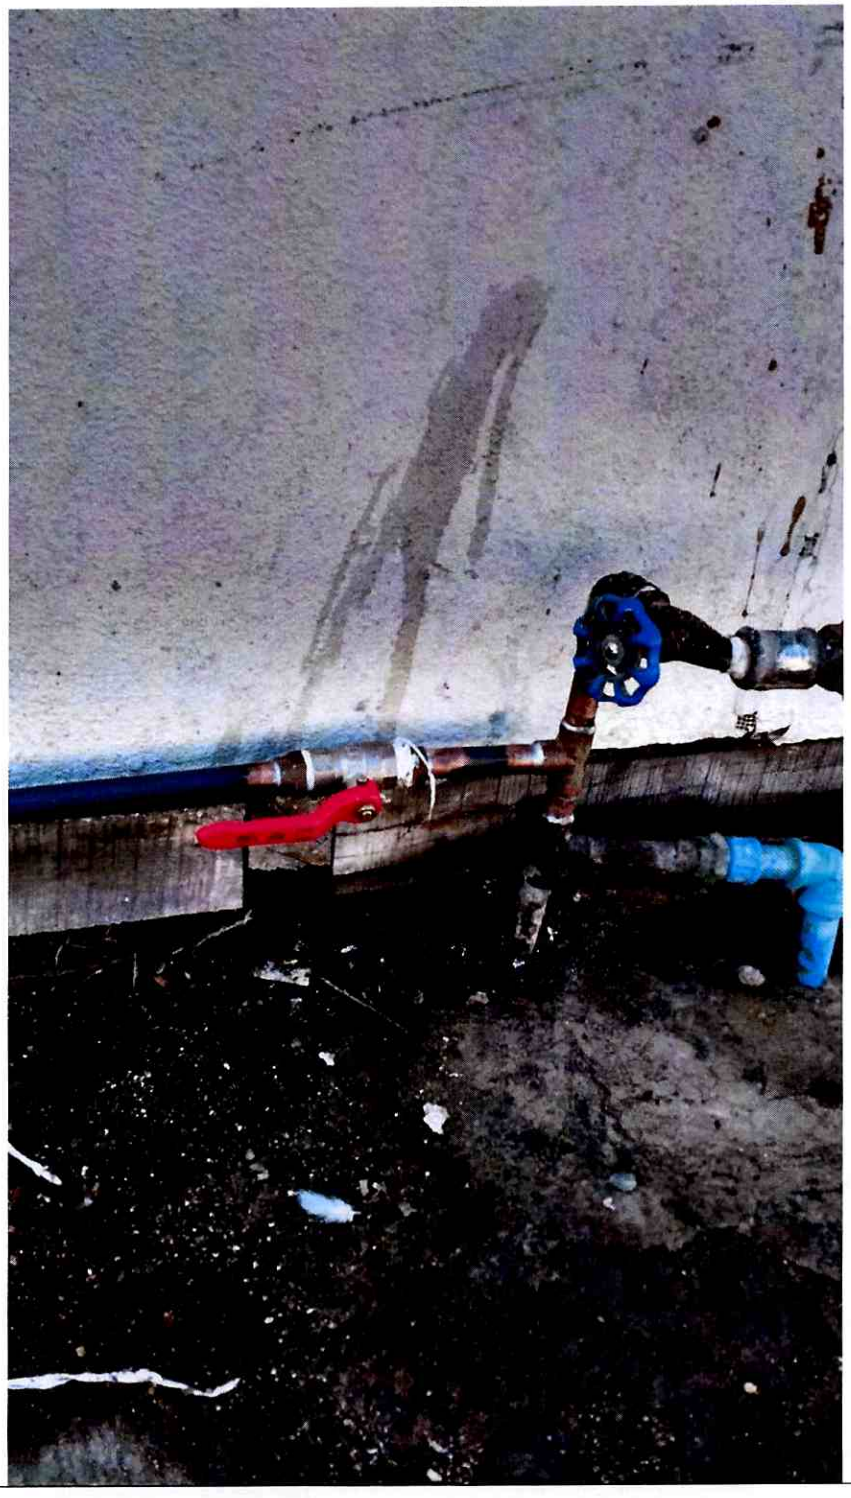

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015


TERMINACIONES

TABLERO ELECTRICO
DONDE SE CONECTO

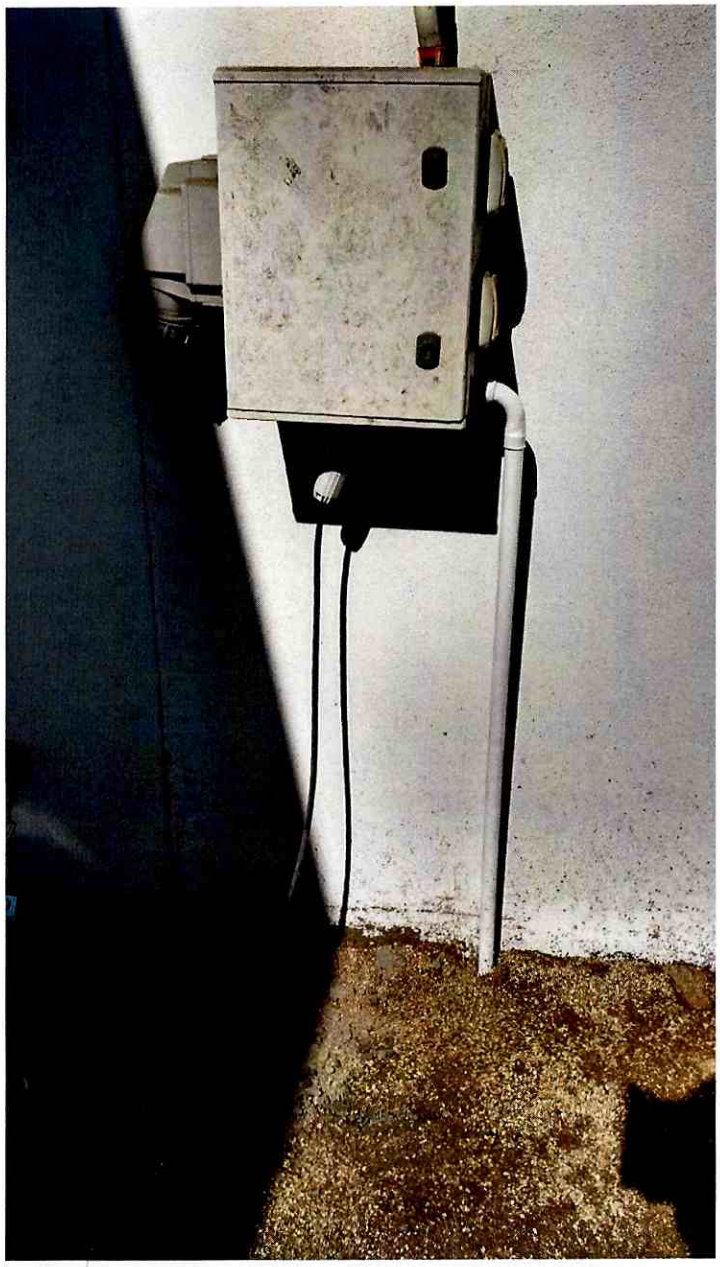

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

TERMINACIONES
AUTOMATICO GENERAL
CON LETRA C

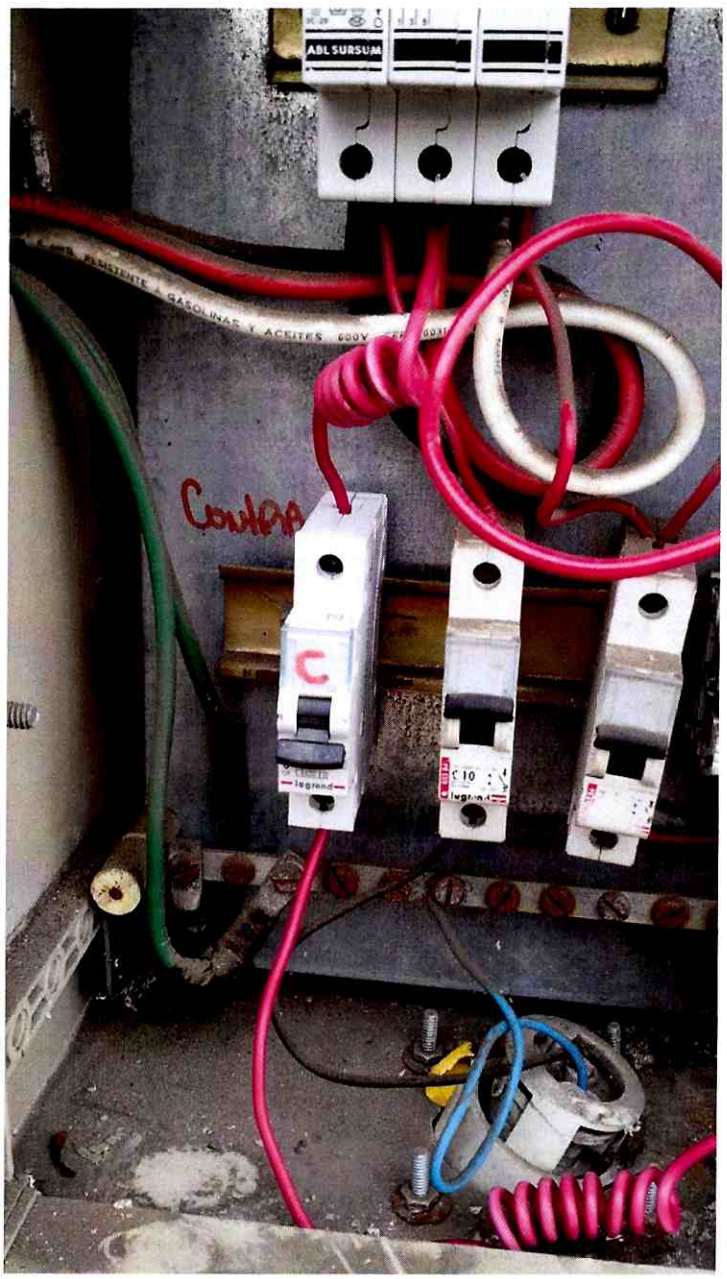

NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

TERMINACIONES

CASETA DE GAS



NFORME DE OBRA		
EMPRESA:	**PROYECTO:**	**FECHA**
FRESAL	Hab. Contenedores puerto ventanas P. Grano puerto Ventanas	Marzo 2015

TRABAJO ENTREGADO



CONSTRUCTORA
FRESAL LTDA.

ATTE JOSE FREDES ESTAY
