
Programación Proyecto Sitio 6
Puerto Ventanas S.A.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Etapas de ejecución Sitio 6**	**1343 días**		
2	**Actividades técnicas**	**270 días**	**jue 25/12/14**	**lun 21/09/15**
3	Instalación de faenas administrativas	60 días	jue 25/12/14	lun 23/02/15
4	Desarrollo de Ingeniería Detalles	180 días	mié 25/03/15	lun 21/09/15
5	**Etapa de Construcción**	**1050 días**	**lun 21/09/15**	**lun 06/08/18**
6	Bases de licitación de Construcción	60 días	lun 21/09/15	vie 20/11/15
7	Etapa de licitación de construcción	150 días	vie 20/11/15	lun 18/04/16
8	Revisión Ofertas	150 días	lun 18/04/16	jue 15/09/16
9	Etapa de negociación	30 días	jue 15/09/16	sáb 15/10/16
10	Adjudicación	2 días	sáb 15/10/16	lun 17/10/16
11	Construcción Obras Infraestructura	720 días	vie 17/06/16	jue 07/06/18
12	Puesta en marcha	60 días	jue 07/06/18	lun 06/08/18
13	**Actividades Generales**	**540 días**	**jue 25/12/14**	**vie 17/06/16**
14	Aprobación Sectorial Provisoria DOP	90 días	jue 25/12/14	mié 25/03/15
15	Aprobación Sectorial Definitiva DOP	150 días	lun 21/09/15	jue 18/02/16
16	Concesión marítima	540 días	jue 25/12/14	vie 17/06/16

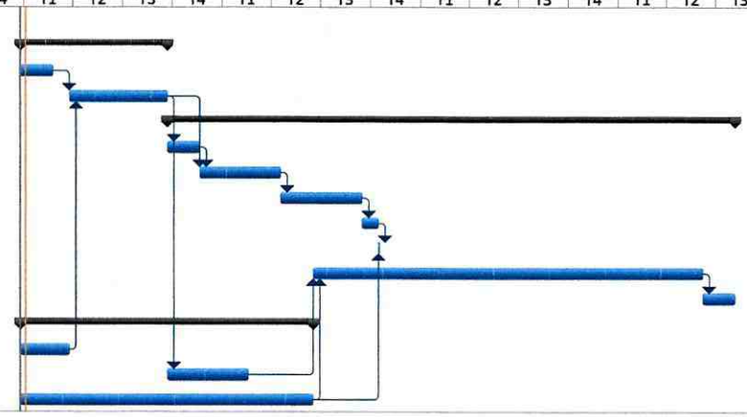

Proyecto: Gant 2010
Fecha: dom 04/01/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual			
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

000005
